

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik

ID	Task Name	Start	% Complete	Finish	April	May	June	July	August
1	Kollektor	Wed 2.05.12	90%	Fri 27.07.12					
2	Karja tn (Ussimäe Rägavere)	Thu 26.07.12	80%	Fri 28.09.12					
3	Rägavere (Kungla - Karja)	Wed 1.08.12	90%	Fri 12.10.12					
4	Raudtee tn, Nortsu tn	Mon 14.05.12	90%	Fri 14.09.12					
5	Rohuaia tn	Wed 2.05.12	90%	Fri 14.09.12					
6	Posti tn	Mon 14.05.12	80%	Fri 28.09.12					
7	Arkna tee	Mon 9.07.12	70%	Fri 26.10.12					
8	Vahtra allee, Roo tn	Mon 21.05.12	90%	Fri 14.09.12					
9	Õli tn, Tormi tn	Wed 2.05.12	90%	Fri 24.08.12					
10	Koidula tn	Tue 12.06.12	90%	Fri 14.09.12					
11	Malmi, Sepa	Tue 12.06.12	90%	Fri 3.08.12					
12	Tallinna tn	Mon 6.08.12	90%	Fri 28.09.12					
13	Jaama tn	Mon 1.10.12	90%	Fri 2.11.12					
14	Härma tn	Mon 25.06.12	90%	Fri 31.08.12					
15	Võidu tn	Mon 3.09.12	60%	Fri 2.11.12					
16	Ussimäe tee	Tue 12.06.12	90%	Fri 6.07.12					
17	Päikese tn	Mon 9.07.12	90%	Fri 13.07.12					
18	Rägavere (Kungla Tuleviku)	Mon 6.08.12	90%	Fri 12.10.12					
19	Tööstuse tn	Thu 21.06.12	90%	Mon 9.07.12					
20	Laada tn	Tue 10.07.12	90%	Fri 17.08.12					
21	Saue tn	Mon 20.08.12	60%	Fri 12.10.12					
22	Adoffi tn	Mon 20.08.12	80%	Fri 12.10.12					
23	Vabaduse survetoru	Mon 23.07.12	80%	Fri 14.09.12					
24	Tiigi tn, Vabriku tn, Õllepruuli tn	Tue 26.06.12	90%	Fri 24.08.12					
25	Lai tn, Parkali tn	Mon 6.08.12	80%	Mon 15.10.12					
26	Linnuriik	Tue 4.09.12	90%	Fri 19.10.12					
27	Rägavere (Murru)	Tue 7.08.12	90%	Fri 19.10.12					
28	Lõuna, Lõuna põik, Kagu	Thu 25.10.12	0%	Fri 25.01.13					
29	Mäekalda tn, Rahu tn	Mon 29.10.12	0%	Fri 22.02.13					
30	Tartu tn	Mon 22.10.12	0%	Fri 29.03.13					

Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23. Date: Thu 18.10.12	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Progress	
	External Tasks		Duration-only		Deadline	

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik


ID	Task Name	Start	% Complete	Finish	April	May	June	July	August
31	Viru, Saueaugu	Mon 5.11.12	0%	Fri 25.01.13					
32	Oru, Vesiveski, Karja	Mon 29.10.12	0%	Fri 29.03.13					
33	Aia tn	Mon 29.10.12	0%	Fri 29.03.13					
34	Paju tn, Mäe tn	Mon 12.11.12	0%	Fri 1.02.13					

Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.
Date: Thu 18.10.12

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	


Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik

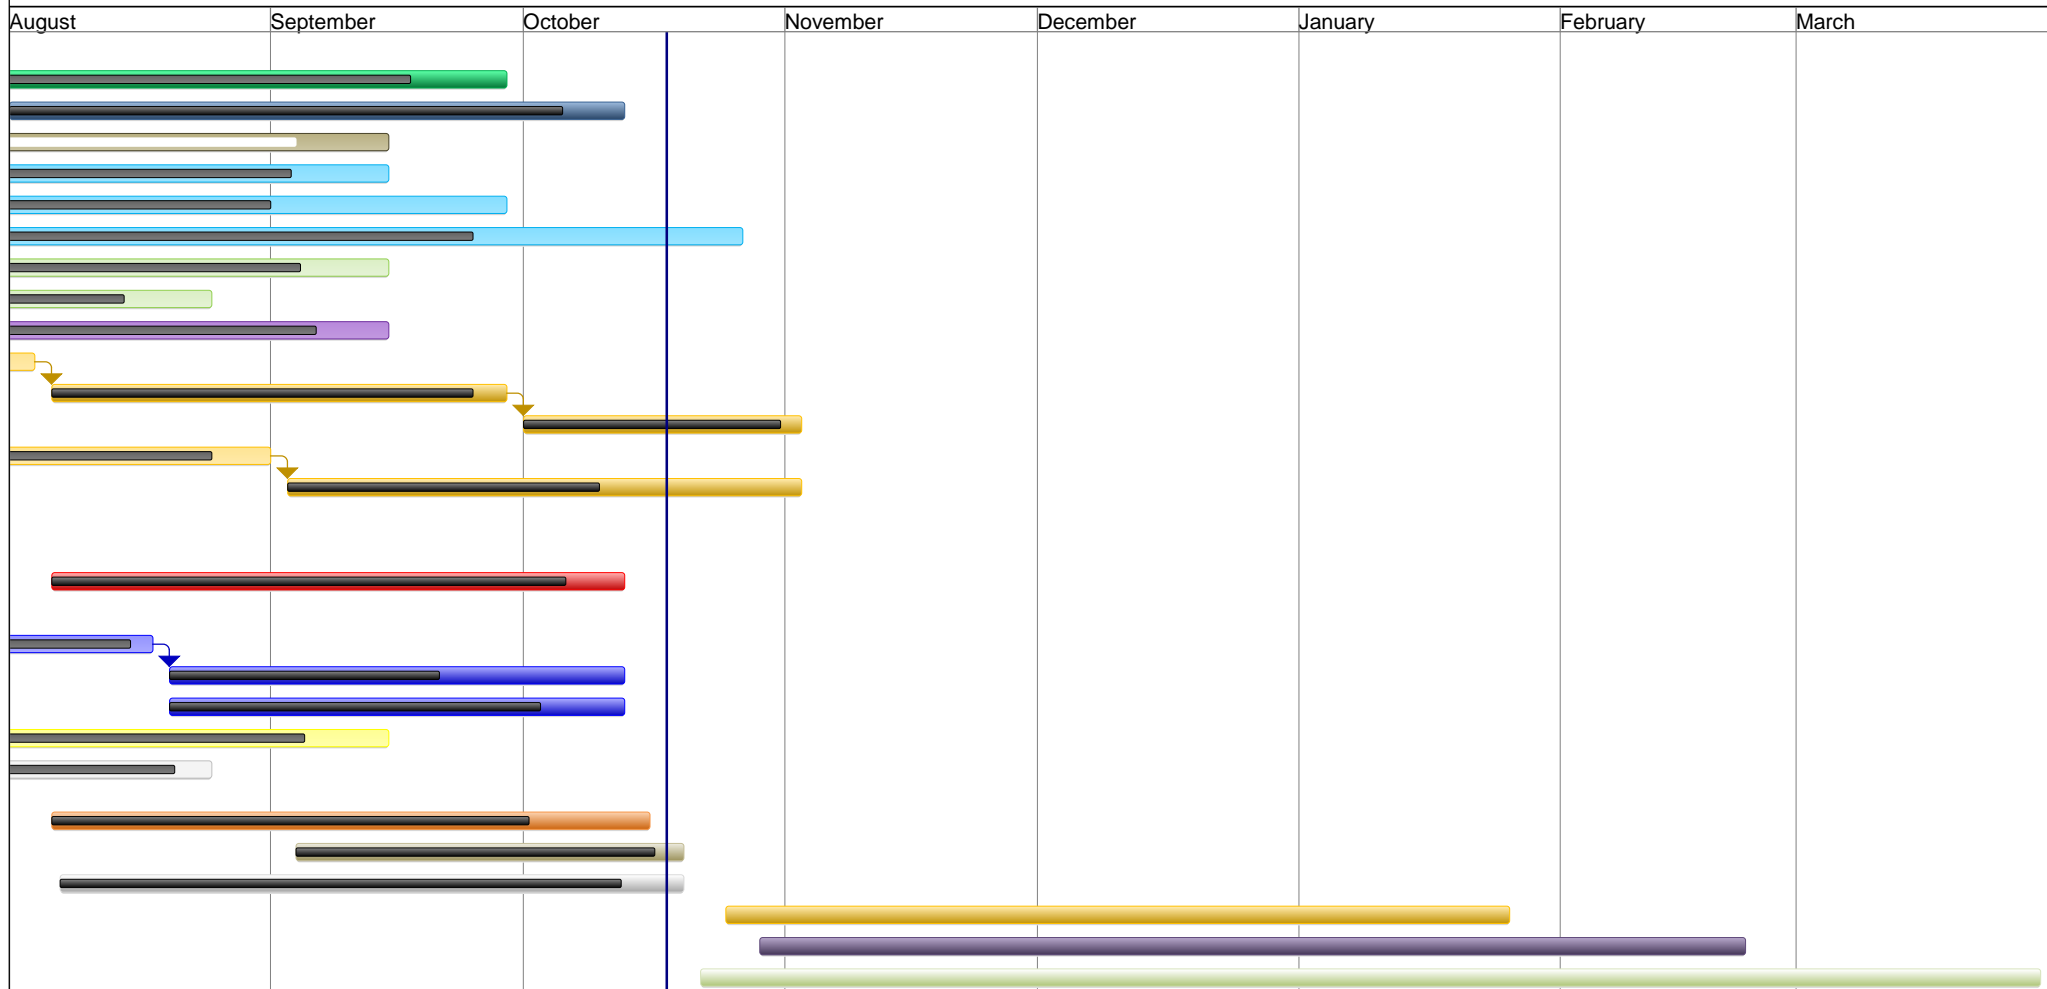









Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23. Date: Thu 18.10.12	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Progress	
	External Tasks		Duration-only		Deadline	

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik



Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.
Date: Thu 18.10.12

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	
